



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：**大里區上田街等汰換管線工程(二)**
第二階段

台灣自來水公司
中華民國 114 年 05 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、影響範圍與戶數	3
三、施工日期	3
四、施作流程	3
五、供水調度因應作為	3
六、停水宣傳方式	4
七、其他事項	4
八、附錄	5
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單.....	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表.....	6
附錄(三) 施工地點示意圖.....	7
附錄(四) 施工及停水訊息.....	10

一、前言

本工程施工地點位於**大里區**，辦理**大里區上田街等汰換管線工程(二)**，
停水改接當日影響用戶數約為**4000**戶。為確保停水作業順暢，擬訂本
作業計畫書作為施工依據。

二、影響範圍與戶數

(一)停水地區：(詳附件一)

大里區：新里里(部分)、大里里(部分)。

**「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、大里路及大新街以
北、國光路二段及新興路以西等一帶。」**

(二)降壓地區：

大里區：新里里、大里里、夏田里、大元里(皆部分)。

**「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、環河路一段及環中東路
七段以北、國光路一段及二段以西等一帶。」**


三、施工日期

自 114 年 6 月 23 日至 114 年 7 月 23 日，周一至周六每日 8 時 30 分至
18 時 30 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水
計劃截止日順延。

**備註：施工日期非停水日期，確切停水日期將於停水日期前另行再以簡
訊宣傳。**

四、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以
進場施作。現場施工順序如下：



五、供水調度因應作為

- 1、送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- 2、停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- 3、先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- 4、每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- 5、載水站、載水車之指揮與管理。

六、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合簡訊通知…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

七、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，每日施工路段(約 60-100 公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等)，每日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2-4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

八、附錄

附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

項 目	內 容
一、工程名稱	大里區上田街等汰換管線工程(二)【RC-114-0401-0013】
二、施工地點	台中市大里區
三、停水原因	大里區上田街等汰換管線工程(二)第二階段，施工日期自 114 年 6 月 23 日至 7 月 23 日，周一至周六每日 8 時 30 分至 18 時 30 分
四、停水時間	停水預估 114 年 6 月 23 日至 114 年 7 月 23 日止，路口制水閥更新及沿線用戶改接自周一至周六當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 *〔用戶改接僅每日施工路段(約 60 公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等) 假日及雨天不施工。〕
五、停水區域 (含水壓降低地區)	停水區域(詳附件一): 大里區：新里里(部分)、大里里(部分)。 「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、大里路及大新街以北、國光路二段及新興路以西等一帶。」 水壓降低地區(詳附件二) 大里區：新里里、大里里、夏田里、大元里(皆部分)。 「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、環河路一段及環中東路七段以北、國光路一段及二段以西等一帶。」
六、減少供水量	預計減少供水量： 1000 立方公尺。
七、停水戶數	(一)當日停水戶數： 4000 戶。 (二)水壓降低戶數： 9000 戶。
備 註	一、 倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請 見諒。 三、若有任何停水問題請電洽(04-24821831 大里服務所) (04-22442469 台中給水廠，1910)，或上本公司網站查詢。

廠所：台中給水廠

區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大里區上田街等汰換管線工程(二)」里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	新里里	何世琦	04-24062910	大里區愛心二街 56-1 號	
2	大里里	李錫全	04-24062635	大里區東里路 11 號	
3	夏田里	曾盛琪	04-24064962	大里區國中路 605 號	
4	大元里	林瑞興	04-24836156	大里區中興路二段 100 號	
5	台中給水廠廠長	孫智強	04-22442469	北屯區遼寧路一段三號	
6	台中給水廠工務股股長	許喬宇	04-22442469	北屯區遼寧路一段三號	
7	台中給水廠監造人員	楊鎧如	04-22442469	北屯區遼寧路一段三號	
8	得意營造有限公司	劉應鐘	0923-330227	台中市大里區永大街 469 號	
9	欣林瓦斯		04-24924760	台中市大里區大峰路 495 號	
10	台電		1911		
11	中華電信		04-22918175		

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**大里區上田街等汰換管線工程(二)**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

114年6月23日至114年7月23日，周一至周六每日上午8時30分至下午18時30分。(如遇豪雨順延辦理，小雨照常施作)。

三、停水時間：**(分段施工、分段停水、夜間恢復供水)**

1. 十字路口制水閥更新改接工程:(詳施工地點示意圖)配合施工路段，分段施工、分段停水，每次停水自當日上午8時30至下午18時30分
2. 施工沿線用戶給水管改接工程:每戶停水當日自上午8時30至下午18時30分

備註：施工日期非停水日期，確切停水日期將於停水日期前另行再以簡訊通知。

四、停水區域(詳附圖)：

大里區：新里里(部分)、大里里(部分)。

「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、大里路及大新街以北、國光路二段及新興路以西等一帶。」

五、減壓區域(詳附圖)：

1. 施工期間受制水閥關閉影響, 施工周邊地區管線壓力可能降低。
2. 影響時間:每日上午8時30分至下午20時30分, 預計降壓12小時, 管線巷道末端將延後2小時恢復。
3. 影響區域:

大里區：新里里、大里里、夏田里、大元里(皆部分)。


「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、環河路一段及環中東路七段以北、國光路一段及二段以西等一帶。」

註:水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	04-22442469	大里服務所	04-24821831
施工進度查詢 得意營造有限公司 劉先生	0923-330227	客服中心	1910

施工地點簡示圖

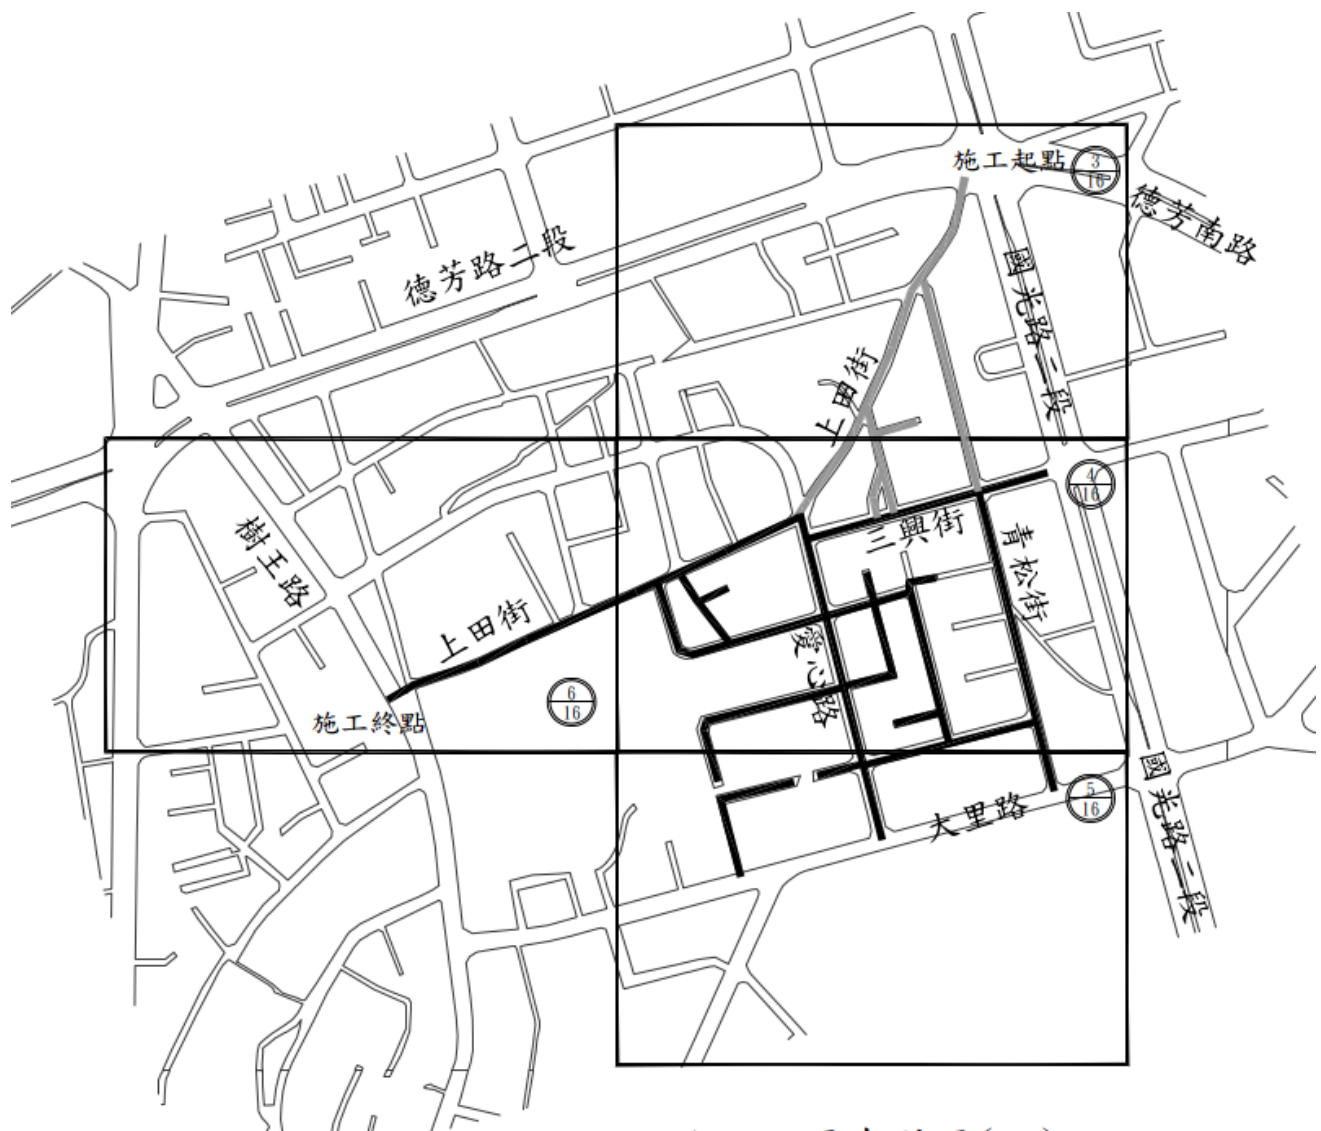




「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、大里路及大新街以北、國光路二段及新興路以西等一帶。」

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將另行公布於本公司網站。

降壓範圍——綠線範圍

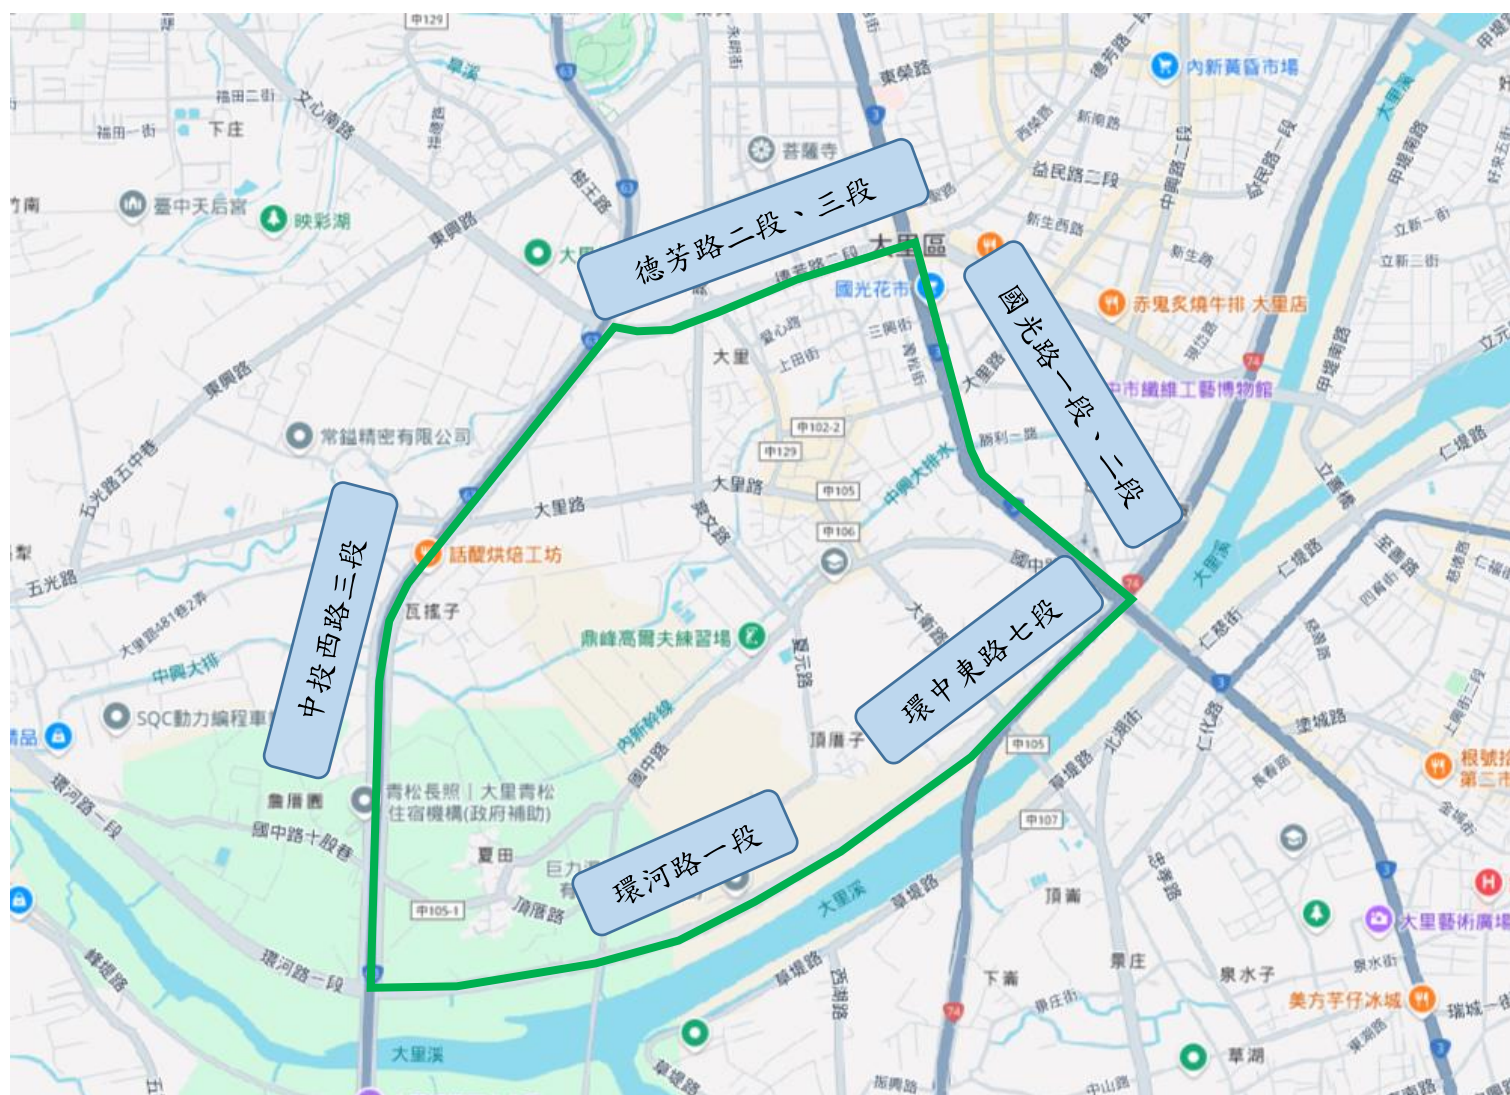

降壓區域：

大里區：新里里、大里里、夏田里、大元里(皆部分)。

「德芳路二段及三段以南、中投西路三段以東、環河路一段及環中東路七段以北、國光路一段及二段以西等一帶。」
