



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：**大里區愛心及內元路等汰換管線
工程(第三階段)**

台灣自來水公司
中華民國 115 年 6 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言.....	3
二、施工期間.....	3
三、停水日期.....	3
四、影響範圍.....	3
五、施作流程.....	3
六、供水調度因應作為.....	4
七、停水宣傳方式.....	4
八、其他事項.....	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單.....	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表.....	6
施工及停水訊息.....	7
施工地點示意圖.....	9
附件一、停水範圍 1.....	10
附件二、停水範圍 2.....	11
附件三、停水範圍 3.....	12

一、前言

本工程施工地點位於**大里區**，辦理**大里區愛心及內元路等汰換管線工程**，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、施工期間

115年06月22日至115年07月22日，周一至周六當日8時30分至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為8337戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍

(一)停水範圍1(詳附件一)：

大里區：新里里(部分)。

「德芳路二段以南、國光路二段以西、樹王路及新興路以東、大里路及大新街以北等一帶」。

停水範圍2(詳附件二)：

大里區：中新里(部分)、大元里(部分)。

「德芳南路以南、環中東路六段以西、中興路二段以東、大元路以北等一帶」。

停水範圍3(詳附件三)：


東區：東門里(部分)，大里區：祥興里(部分)。

「東光園路及建德街以南、旱溪西路一段以西、大智路以東、日新路以北等一帶」。

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水 LINE 官方停水公告發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2~4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	大里區愛心及內元路等汰換管線工程【RZ-115-0401-0005】
二、施工地點及期間	施工地點：台中市大里區 施工期間自 115 年 06 月 22 日至 115 年 07 月 22 日，周一至周六 當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
三、停水原因	辦理大里區愛心及內元路等汰換管線工程路口改接(第三階段)
四、停水日期	施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。 (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 8337 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
五、影響範圍	(一)停水範圍 1(詳附件一)： 大里區：新里里(部分)。 「德芳路二段以南、國光路二段以西、樹王路及新興路以東、大里路及大新街以北等一帶」。 停水範圍 2(詳附件二)： 大里區：中新里(部分)、大元里(部分)。 「德芳南路以南、環中東路六段以西、中興路二段以東、大元路以北等一帶」。 停水範圍 3(詳附件三)： 東區：東門里(部分)，大里區：祥興里(部分)。 「東光園路及建德街以南、旱溪西路一段以西、大智路以東、日新路以北等一帶」。 備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
六、減少供水量	預計減少供水量：2000 立方公尺。
七、影響戶數	(一)幹管改接工程：約為 8337 戶。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)。
備 註	(一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 (二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 (三)若有任何停水問題請電洽(大里服務所：04-24821831；台中給水廠：04-22442469；1910)或上本公司停水公告系統查詢。

廠所：台中給水廠 區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大里區愛心及內元路等汰換管線工程」

里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	新里里	何世琦	(04) 24062910	臺中市大里區新里里愛心二街 56-1 號	
2	中新里	廖榮木	(04) 24852155	臺中市大里區中新里現岱路 158 巷 9 號	
3	大元里	林瑞興	(04) 24836156	臺中市大里區大元里中興路二段 100 號	
5	東門里	莊錦聰	(04) 22137174	臺中市東區東門里東光園路 234 號	
6	祥興里	黃春海	(04) 22805049	臺中市大里區祥興里立德東街 2 號	
7	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
8	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
9	台中給水廠監造人員	賴淑貞	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
10	得意營造有限公司	巫俊德	(04)24069493	台中市大里區精誠南路 1200-1 號	
11	欣林瓦斯		(04)24924760	台中市大里區大峰路 495 號	
12	台電		(04)22245131		
13	中華電信		(04)22304844		

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「大里區愛心及內元路等汰換管線工程」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

115年06月22日至115年07月22日，周一至周六當日8時30分至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為8337戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍：

(一)停水範圍1(詳附件一)：

大里區：新里里(部分)。

「德芳路二段以南、國光路二段以西、樹王路及新興路以東、大里路及大新街以北等一帶。」

停水範圍2(詳附件二)：

大里區：中新里(部分)、大元里(部分)。

「德芳南路以南、環中東路六段以西、中興路二段以東、大元路以北等一帶」。

停水範圍3(詳附件三)：

東區：東門里(部分)，大里區：祥興里(部分)。

「東光園路及建德街以南、旱溪西路一段以西、大智路以東、日新路以北等一帶」。



1. 實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。
2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
3. 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	(04)2244-2469	大里服務所	(04) 2482-1831
施工進度查詢 得意營造有限公司 巫俊德	04-24069493	客服中心	1910

施工地點範圍簡示圖

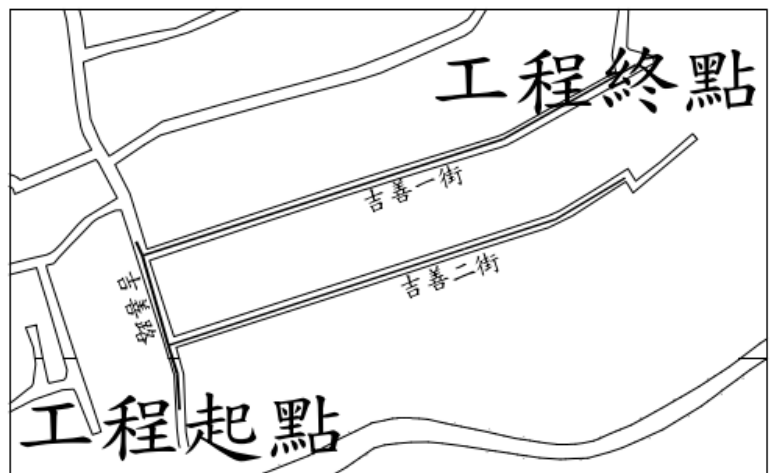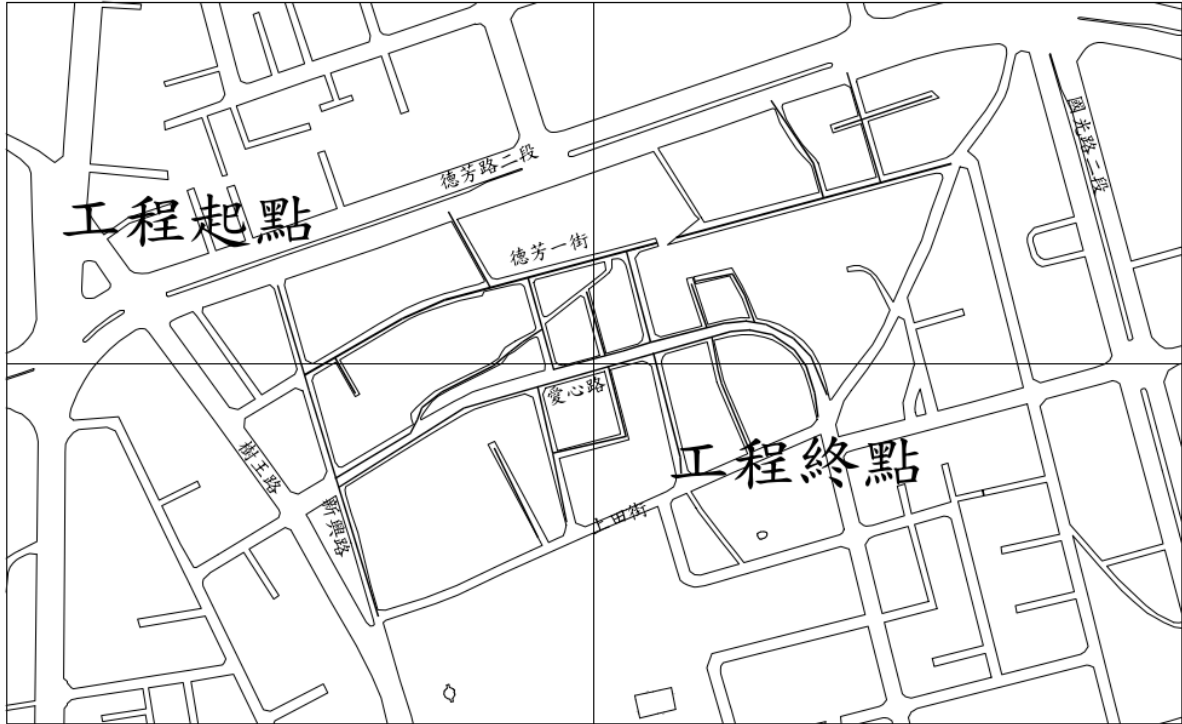

施工可能造成停水之影響範圍 1(紅線內)



施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍：

大里區：新里里(部分)。

「德芳路二段以南、國光路二段以西、樹王路及新興路以東、大里路及大新街以北等一帶」。

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

施工可能造成停水之影響範圍 2(紅線內)



施工可能造成停水之影響範圍：

大里區：中新里(部分)、大元里(部分)。

「德芳南路以南、環中東路六段以西、中興路二段以東、大元路以北等一帶」。

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

施工可能造成停水之影響範圍 3(紅線內)



施工可能造成停水之影響範圍：

東區：東門里(部分)，大里區：祥興里(部分)。

「東光園路及建德街以南、早溪西路一段以西、大智路以東、日新路以北等一帶」。

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱

台灣自來水公司 TAIWAN WATER CORPORATION

停水公告查詢系統

澎湖縣

基隆市 桃園市 新北市 新竹市 新竹縣 苗栗縣 宜蘭縣 臺中市 彰化縣 南投縣 花蓮縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 臺南市 高雄市 臺東縣 屏東縣

▲ 紅色表示該縣市有災害停水事件
■ 綠色表示區域供水正常
● 黃色表示該縣市部分地區有停水或降壓事件

☎ 24小時客服專線: 1910

申請停水通知 (另開新視窗)
地圖資訊版 (另開新視窗)
臨時供水站查詢 (另開新視窗)
供水現況回報 (另開新視窗)

民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選連結

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

台水公告

台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

聊天 貼文

TaiwanWater @586zvzut

搜尋官方帳號

查看一覽 透過我的優惠券搜尋 用姓名搜尋
