



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：**大里區光正路等汰換管線工程
(第二階段)**

台灣自來水公司
中華民國 115 年 08 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、施工期間	3
三、停水日期	3
四、影響範圍	3
五、施作流程	3
六、供水調度因應作為	4
七、停水宣傳方式	4
八、其他事項	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表	6
施工及停水訊息	7
施工地點示意圖	8
附件一、停水及降壓範圍	9

一、前言

本工程施工地點位於**大里區**，辦理**大里區光正路等汰換管線工程**，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、施工期間

115 年 8 月 28 日至 115 年 9 月 28 日，周一至周六當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為 718 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

四、影響範圍

(一)停水範圍(詳附件一)：

大里區：塗城里(部分)。

「仁化路以南、光正路 60 巷以北、光正路兩側一帶。」

(二)水壓降低範圍：同停水範圍。


大里區：塗城里(部分)。

「仁化路以南、光正路 60 巷以北、光正路兩側一帶。」

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2~4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	大里區光正路等汰換管線工程【RC-115-0401-0013】
二、施工地點及期間	施工地點：台中市大里區 施工期間自 115 年 8 月 28 日至 115 年 9 月 28 日，周一至周六當 日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
三、停水原因	辦理大里區光正路等汰換管線工程路口改接(第二階段)
四、停水日期	施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊 登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及 沿線用戶改接時停水。 (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 718 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自 當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
五、影響範圍	停水範圍(詳附件一)： 大里區：塗城里(部分)。 「仁化路以南、光正路 60 巷以北、光正路兩側一帶。」 水壓降低範圍：同停水範圍 備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公 告查詢系統。
六、減少供水量	預計減少供水量：2000 立方公尺。
七、影響戶數	(一)幹管改接工程：約為 718 戶。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)。
備 註	(一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停 水日期決定後，當再行通知。 (二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略 延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 (三)若有任何停水問題請電洽(大里服務所：04-24821831；台中 給水廠：04-22442469;1910)或上本公司停水公告系統查詢。

廠所：台中給水廠 區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大里區光正路等汰換管線工程」

里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	塗城里	黃仁耀	04-24912089	臺中市大里區塗城里光正路 233 之 1 號	
2	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
3	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
4	台中給水廠監造人員	顏家麒	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
5	得意營造有限公司	柯宗昇	(04)24069493	臺中市大里區永隆里永大路 469 號	
6	欣林瓦斯		04-24924760	台中市大里區大峰路 495 號	
7	台電		(04)24924760		
8	中華電信		(04)22918175		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施 工 及 停 水 訊 息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**大里區光正路等汰換管線工程**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

115年8月28日至115年9月28日，周一至周六當日8時30分至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為718戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍：

(一)停水範圍(詳附件一)：

大里區：塗城里(部分)。

「仁化路以南、光正路60巷以北、光正路兩側一帶。」

(二)水壓降低範圍：同停水範圍。

大里區：塗城里(部分)。

「仁化路以南、光正路60巷以北、光正路兩側一帶。」

1. 實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。

2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。


3. 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	(04)2244-2469	台中服務所	(04) 2254-2191
施工進度查詢 永樺工程有限公司	0937-226586	客服中心	1910

施工地點範圍簡示圖

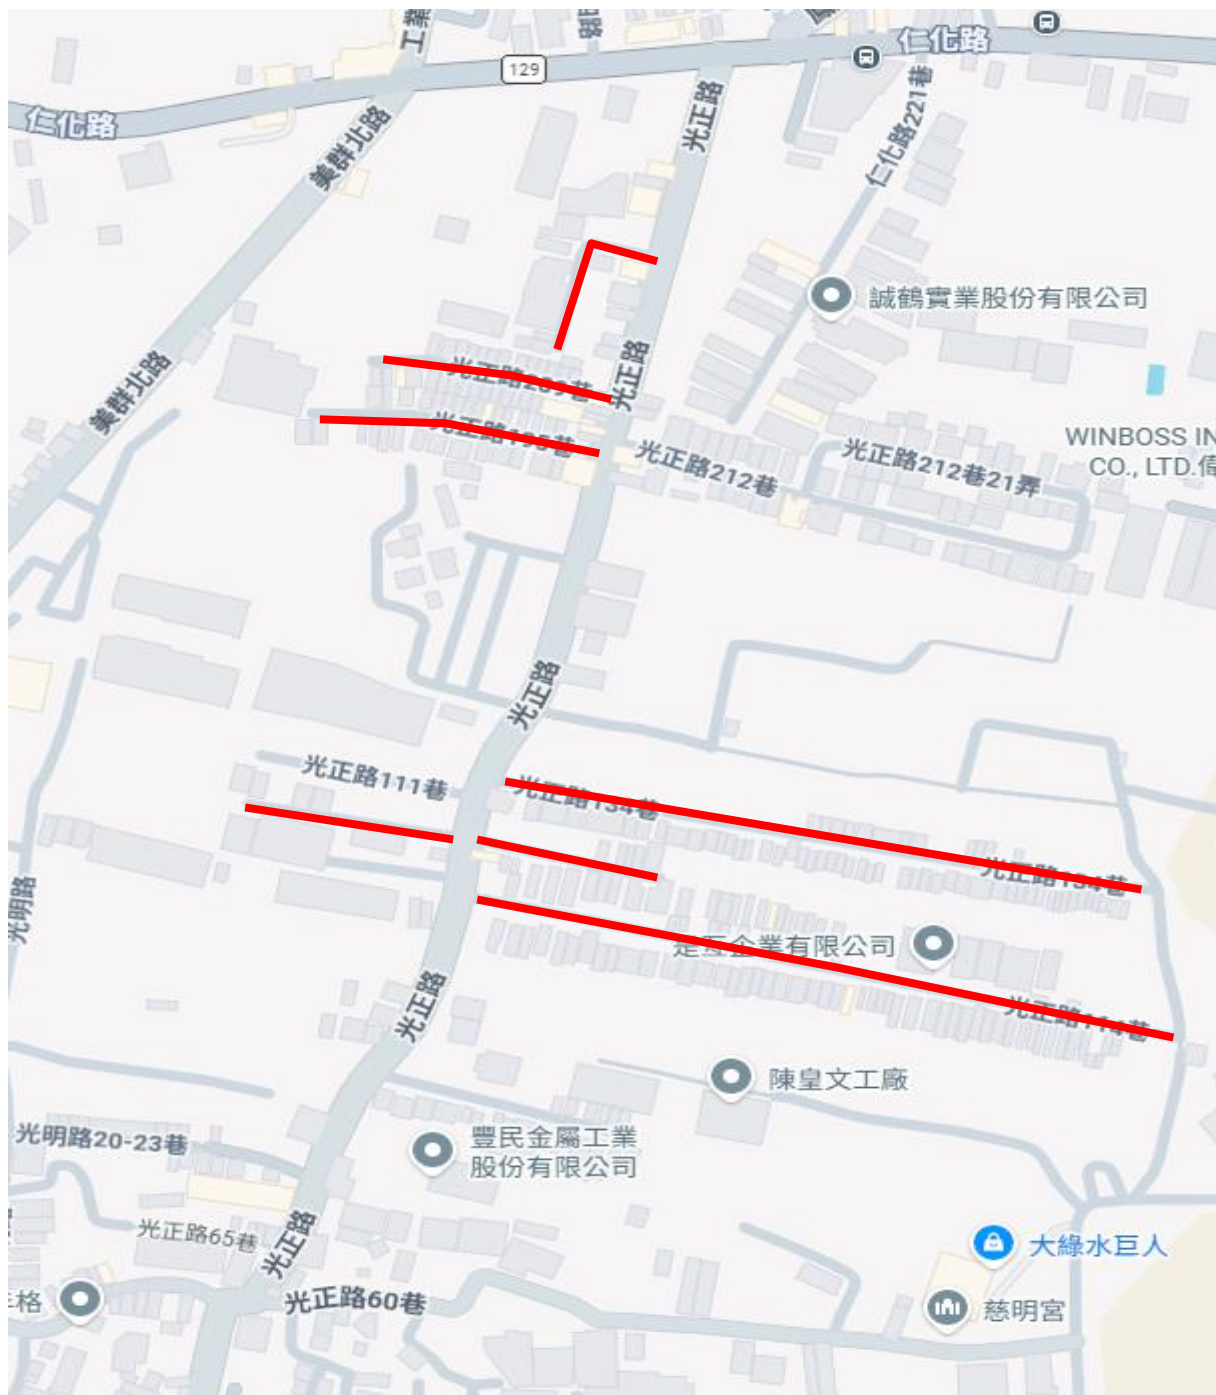

附件一

施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍(紅線內)



施工可能造成停水及水壓降低之影響範圍：

大里區：塗城里。

「仁化路以南、光正路 60 巷以北、光正路兩側一帶。」

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱

台灣自來水公司 TAIWAN WATER CORPORATION

停水公告查詢系統

澎湖縣

基隆市、桃園市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣

▲ 紅色表示該縣市有災害停水事件
■ 綠色表示區域供水正常
● 黃色表示該縣市部分地區有停水或降壓事件
☎ 24小時客服專線: 1910

申請停水通知 (另開新視窗)
地圖資訊版 (另開新視窗)
臨時供水站查詢 (另開新視窗)
供水現況回報 (另開新視窗)

民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選連結

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

☆ : ✕

停水公告

台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

聊天 貼文

TaiwanWater @586zvzut

搜尋官方帳號

查看一覽 透過我的優惠券搜尋 用姓名搜尋
